


Łódź Katowice Rzeszów
Zielona Góra Gdańsk Szczecin
Góra Kielce Białystok
Kraków Warszawa
Opole Lublin Wrocław
Poznań
Bydgoszcz
Olsztyn

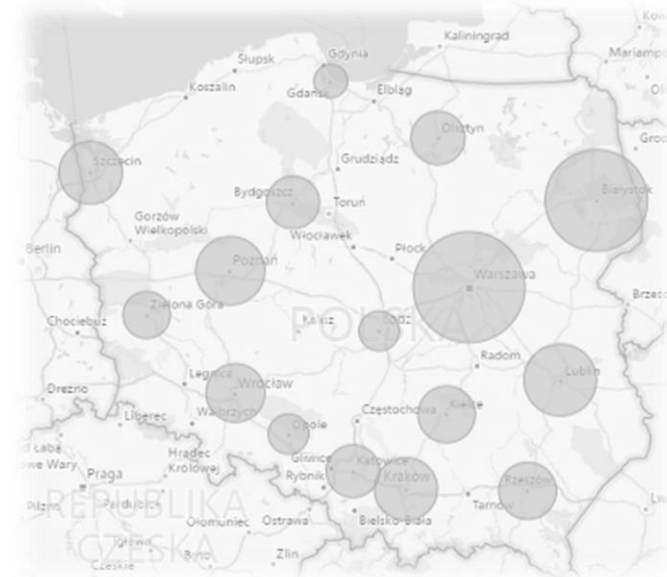


Przetargi na dokumentację Dokumentacje w opracowaniu Zagadnienia do omówienia


Tomasz Stańczak

DPR


Stan przygotowania inwestycji z PBDK 2014-2023 (poz.1-117) [km,%]

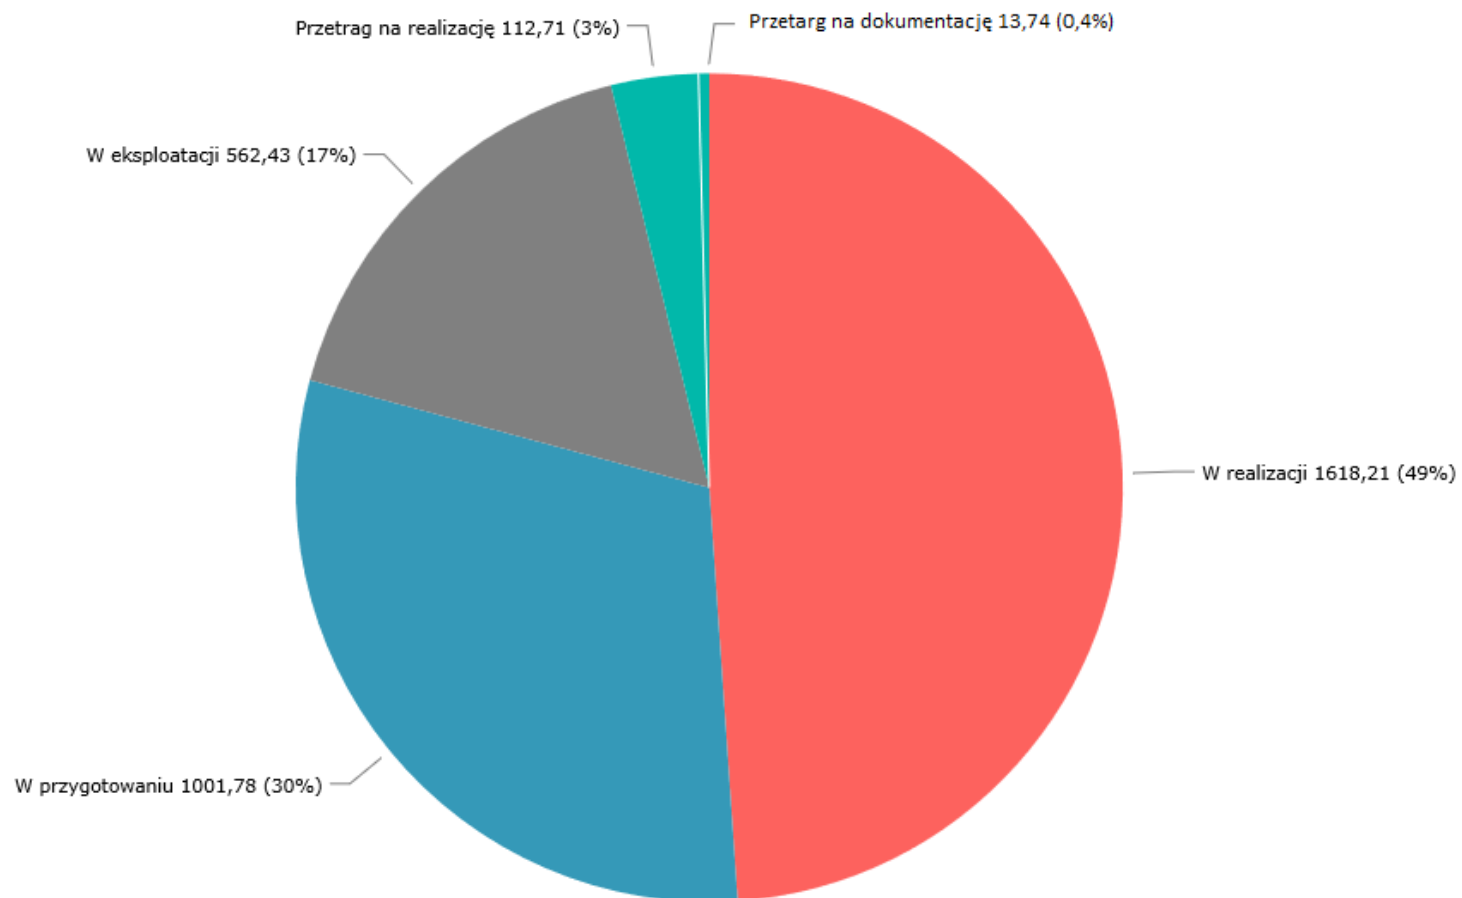

Stan przygotowania inwestycji z PBDK 2014-2023 (poz.119-1158) [km,%]

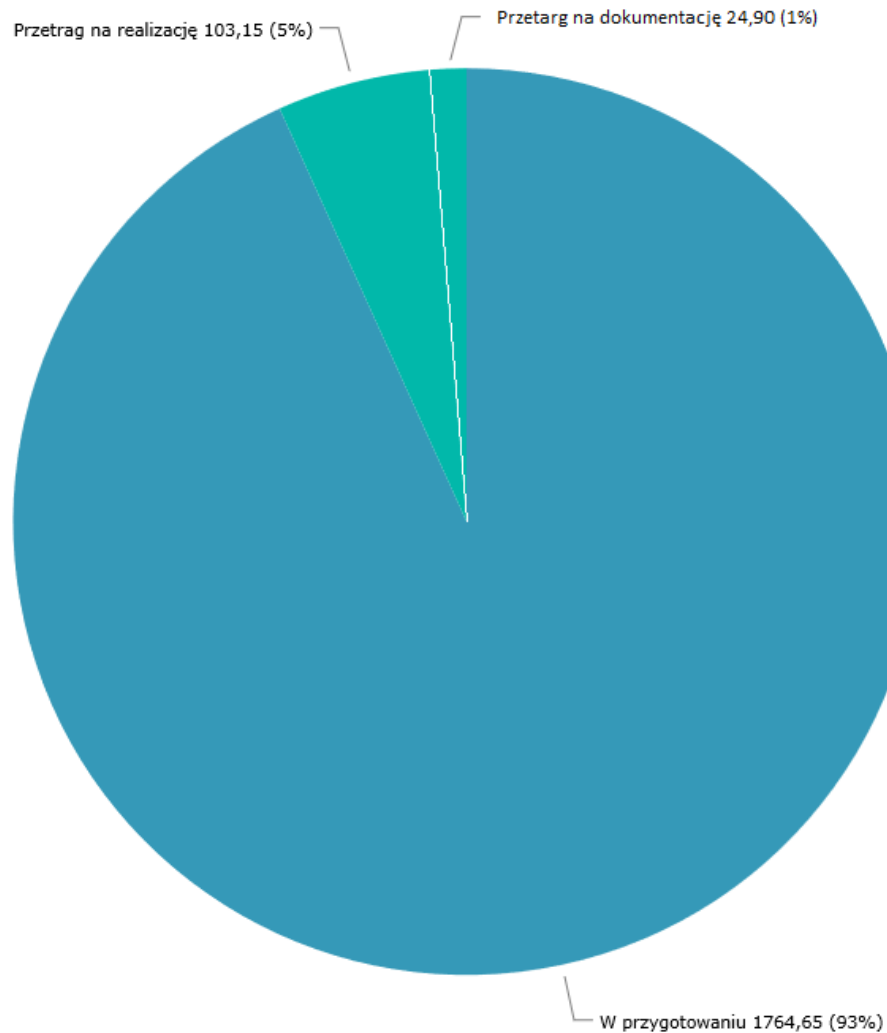


Stan przygotowania inwestycji spoza PBDK 2014-2023 [km,%]

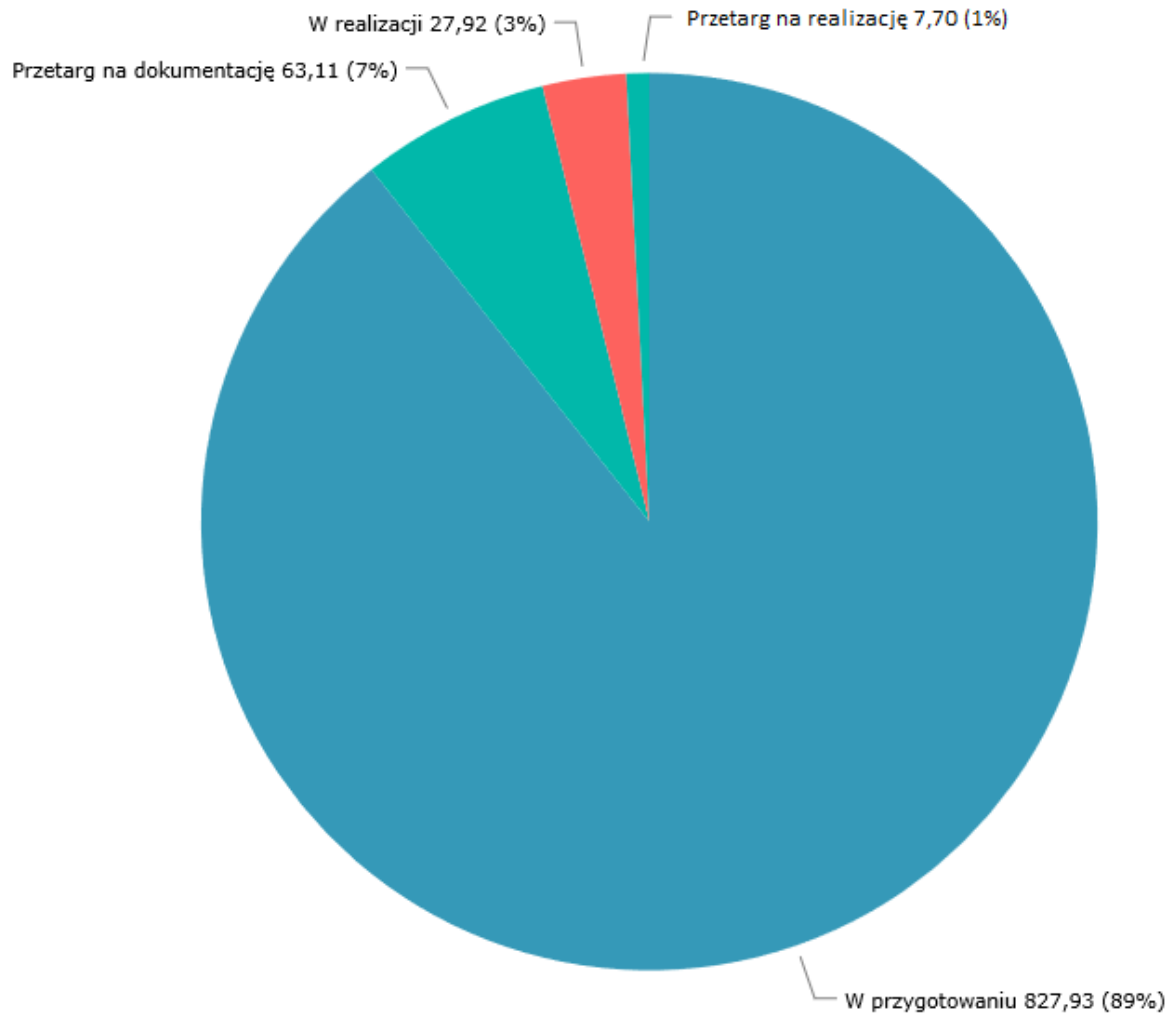


Łączna długość dróg będących obecnie na etapie przetargu na dokumentację

Łączna długość [km] wg StatusPBDK




102
łączna długość [km]


Łączna długość [km] wg Etap realizacji i StatusPBDK

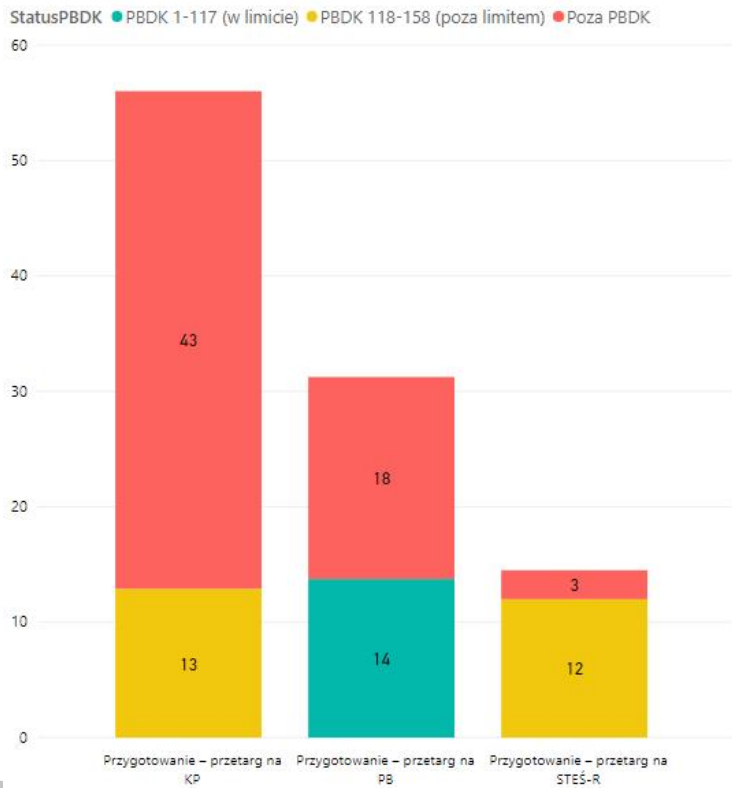

Łączna długość [km] wg Oddział i StatusPBDK

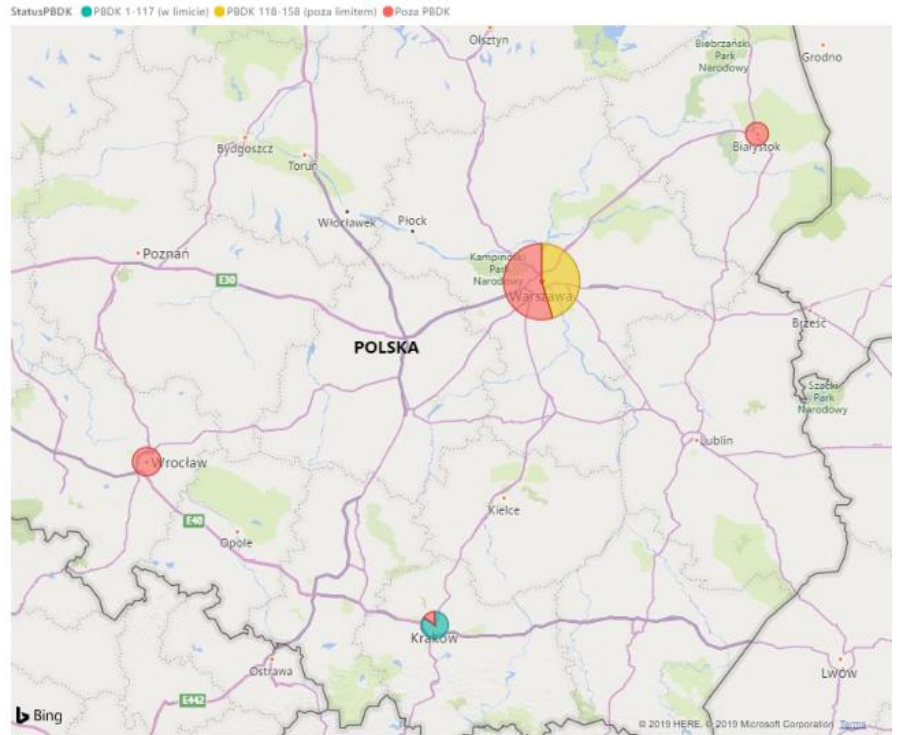

Łączna długość [km] wg Oddział i StatusPBDK

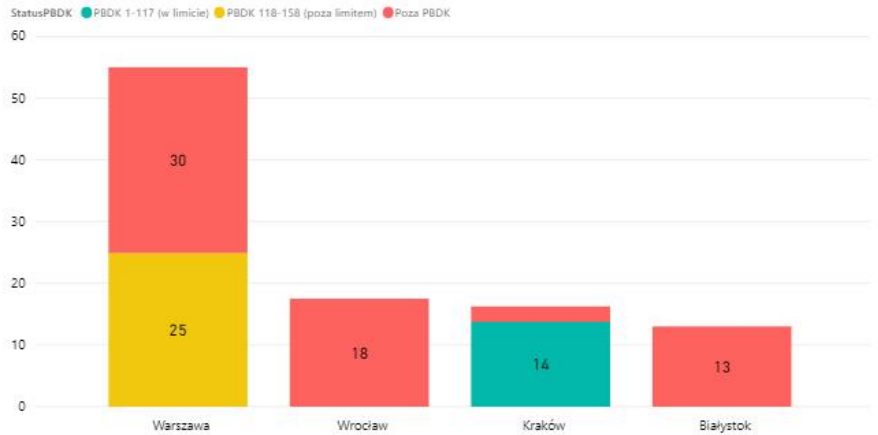


Planowane przetargi na dokumentację w nadchodzących latach


Planowana data ogł. przet. na dok. - określi rok lub zakres lat



Łączna długość [km] wg Rok

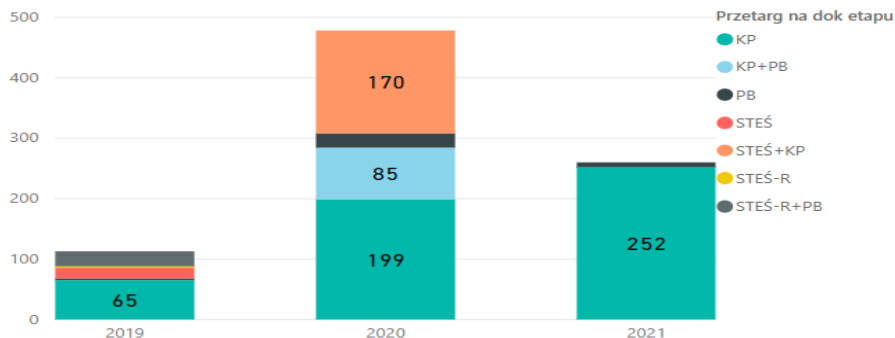


Łączna długość [km] wg Przetarg na dok etapu

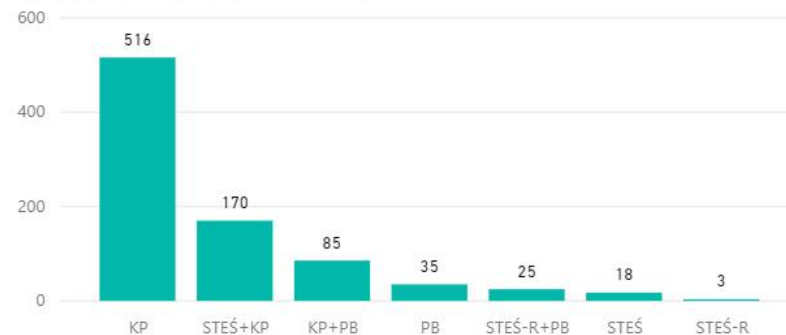

Łączna długość [km] wg Oddział



Łączna długość [km] wg Oddział

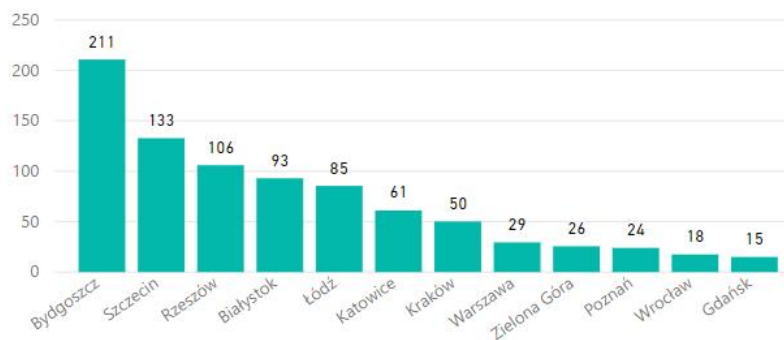

851

Łączna długość [km]


Łączna długość dróg będących obecnie na etapie opracowywania dokumentacji

Etap realizacji



- Przygotowanie – w opracowaniu KP
- Przygotowanie – w opracowaniu PB
- Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ
- Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R

2 711
łączna długość [km]

Łączna długość [km] wg Etap realizacji

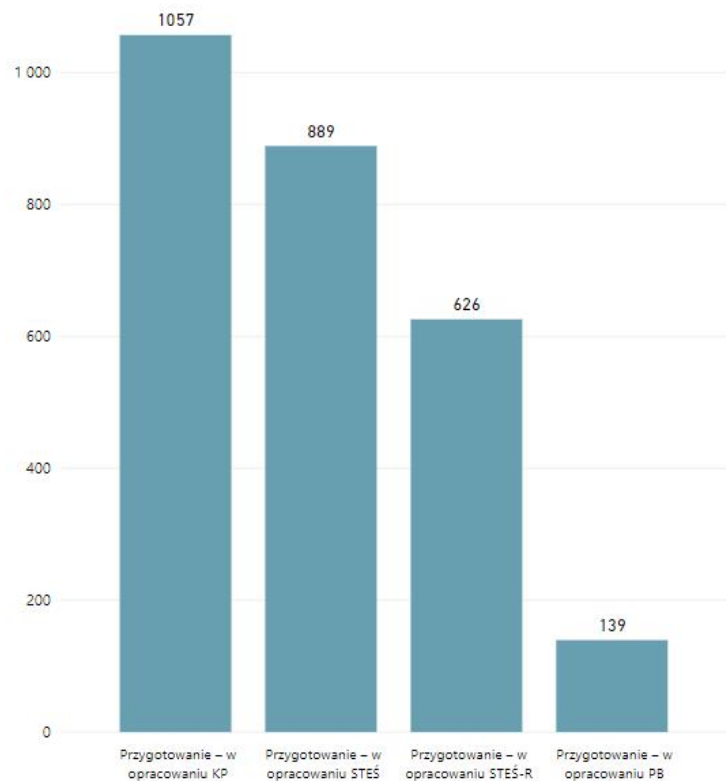

Łączna długość [km] wg Oddział

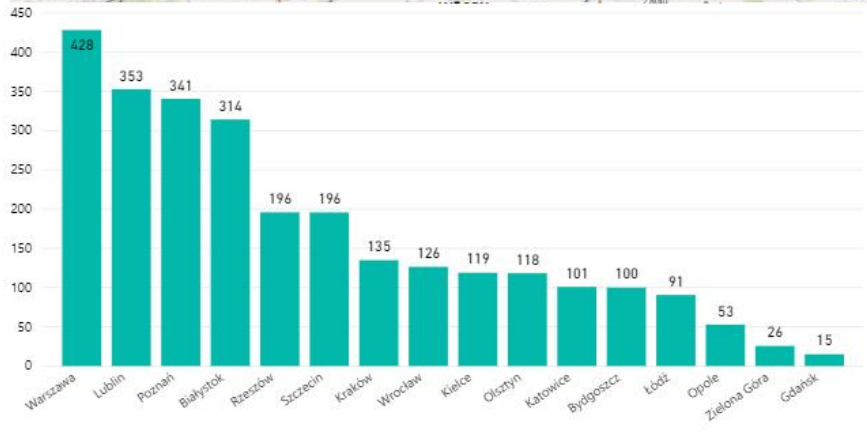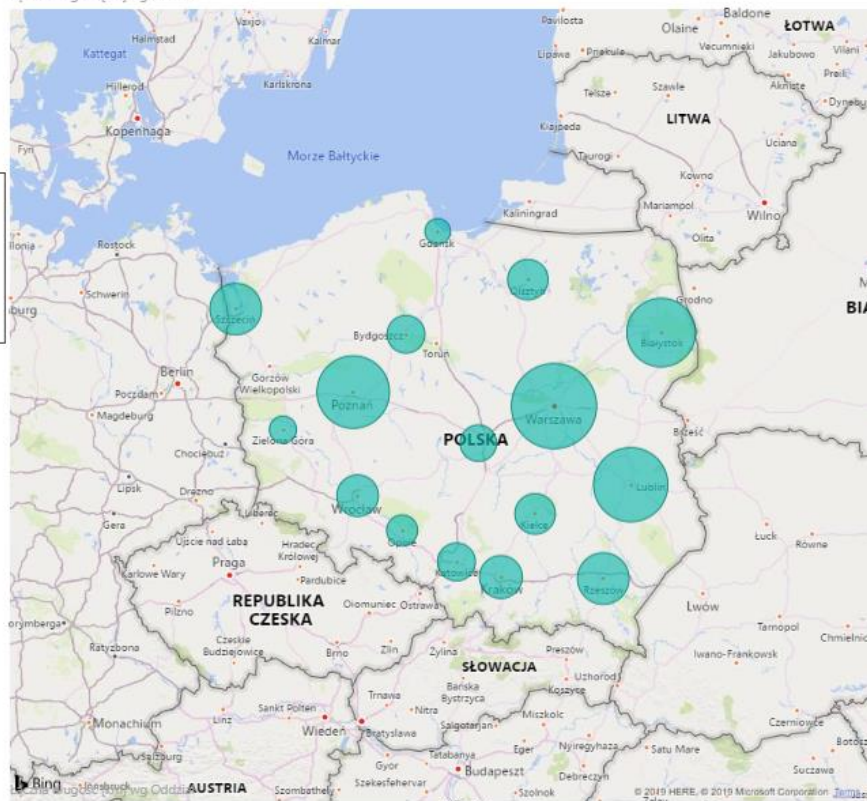


W opracowaniu STEŚ

889

Łączna długość [km]


Jakie firmy aktualnie opracowują STEŚ:

Łączna długość [km] wg Wykonawca STEŚ

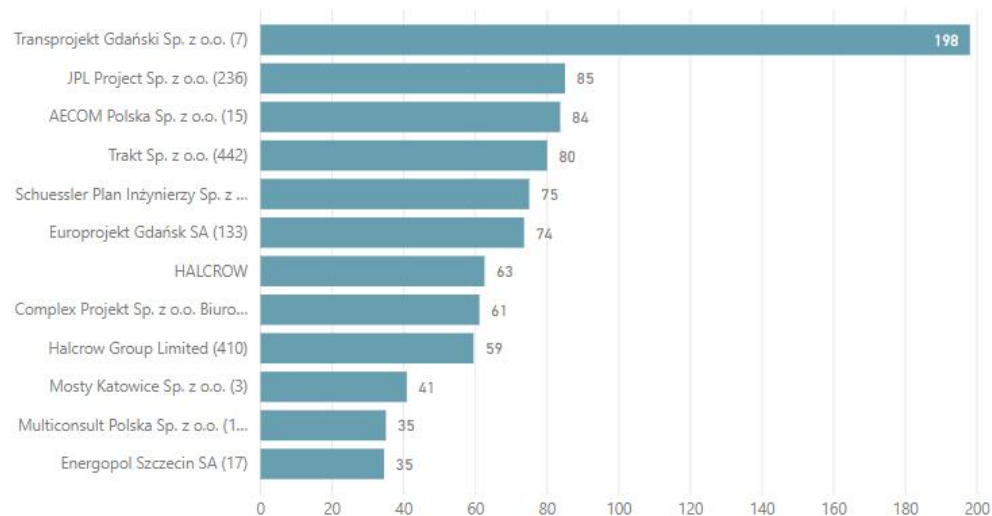


Gdzie aktualnie projektuje się STEŚ:

Łączna długość [km] wg Oddział

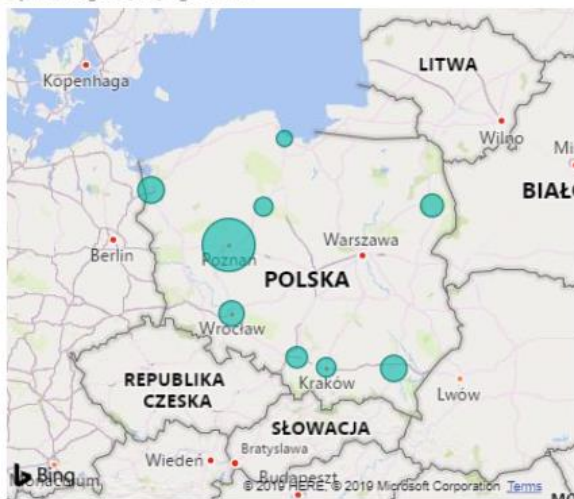

Łączna długość [km] wg Oddział

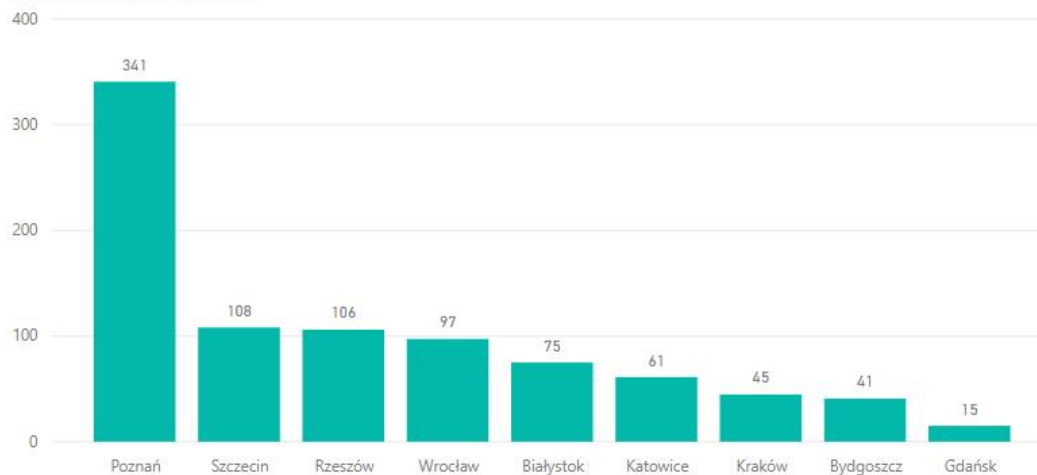


W opracowaniu STEŚ-R

626

łączna długość [km]


Jakie firmy aktualnie opracowują STEŚ-R:

łączna długość [km] wg Wykonawca STEŚ-R

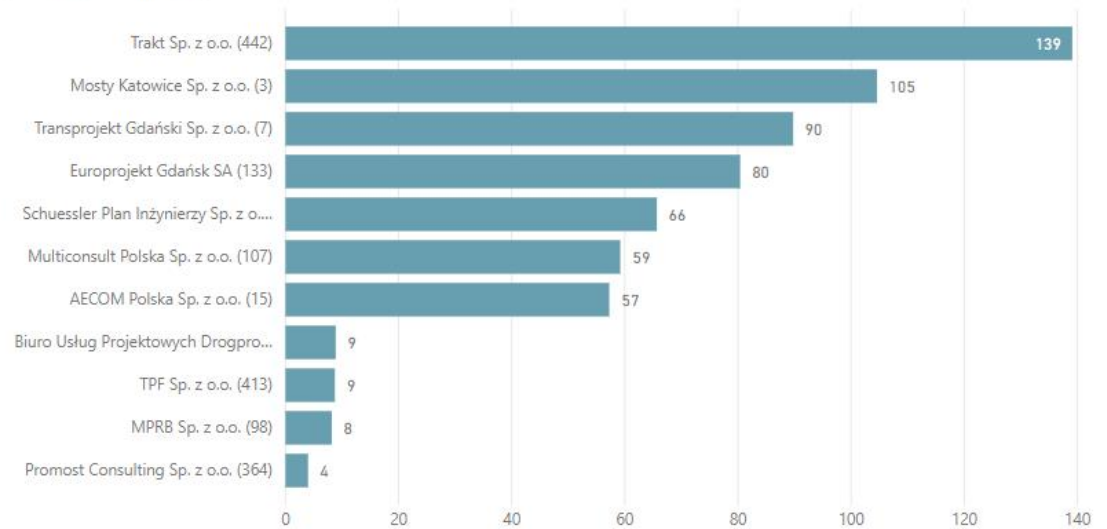


Gdzie aktualnie projektuje się STEŚ-R:

łączna długość [km] wg Oddział

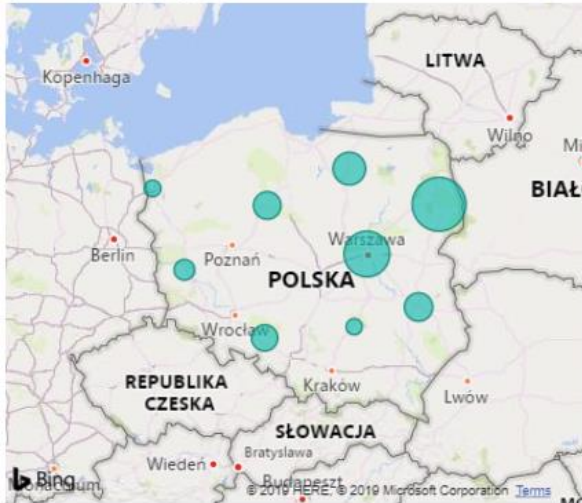

łączna długość [km] wg Oddział

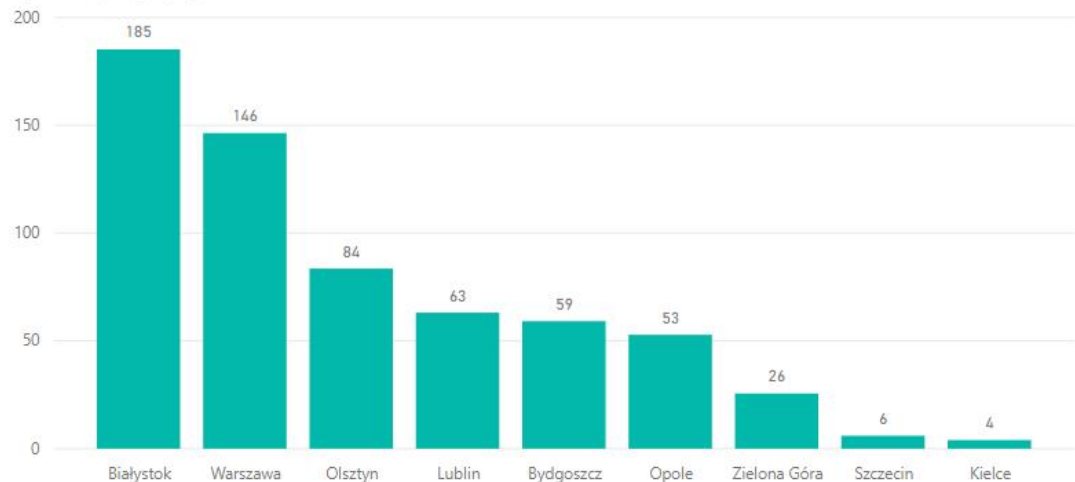


W opracowaniu KP

1 057

łącna długość [km]


Gdzie aktualnie projektuje się KP:

łącna długość [km] wg Oddział

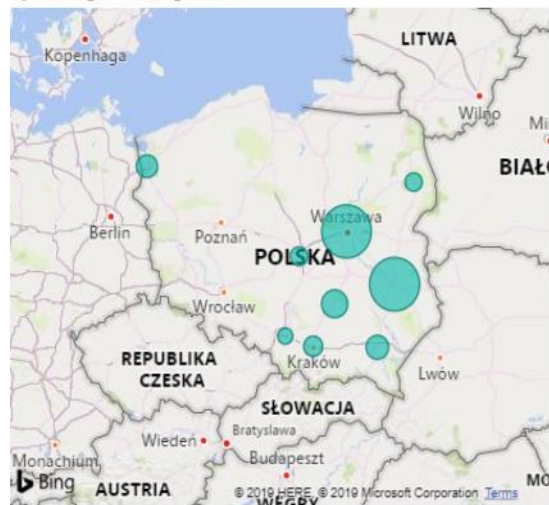


Jakie firmy aktualnie opracowują KP:

łącna długość [km] wg Wykonawca KP

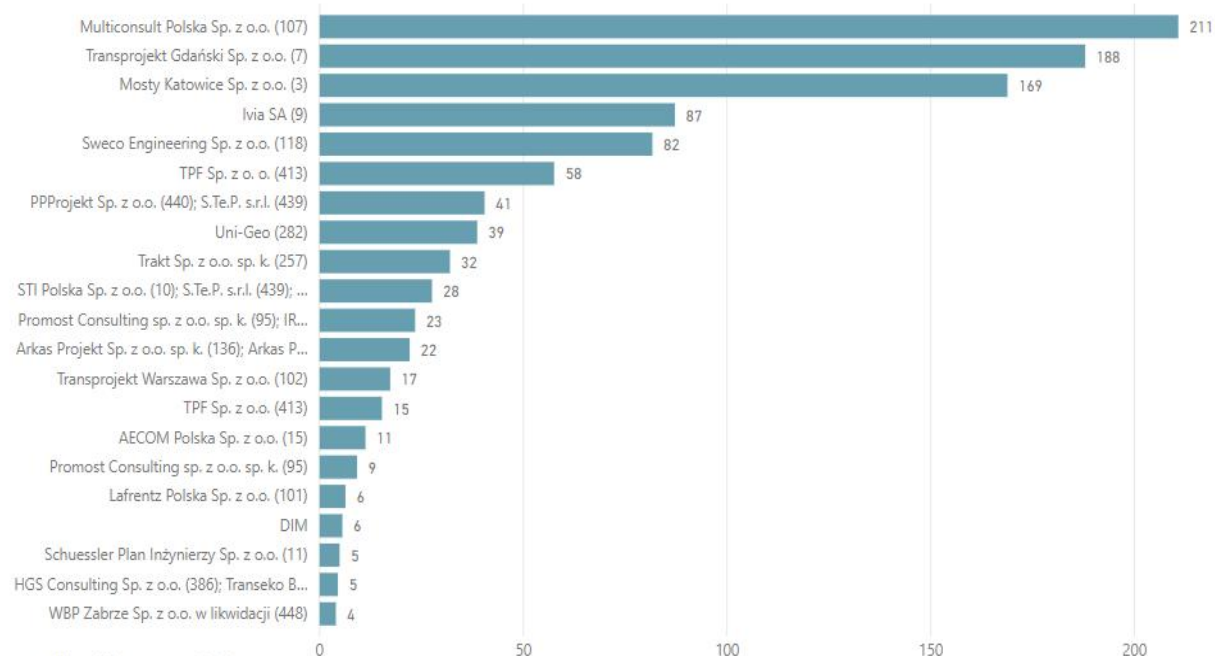

łącna długość [km] wg Oddział

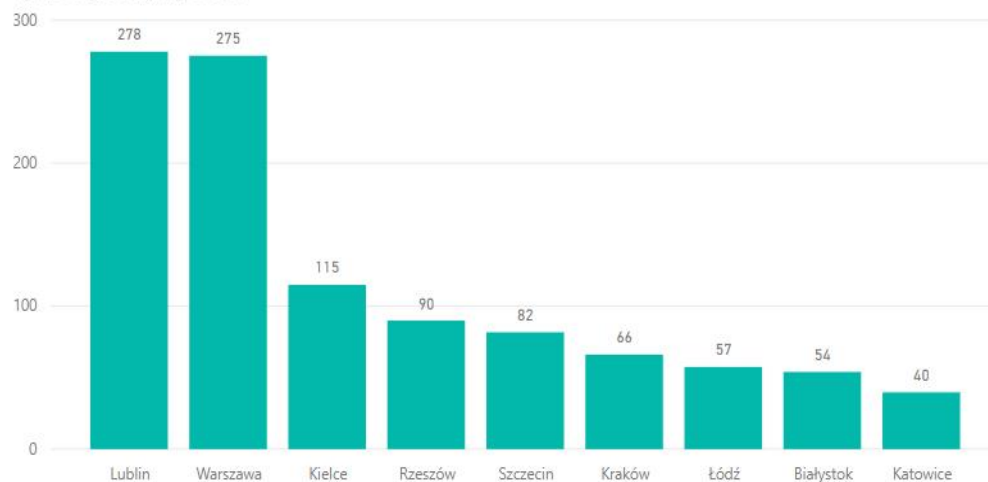


W opracowaniu PB

139

łącna długość [km]


Gdzie aktualnie projektuje się PB:

łącna długość [km] wg Oddział

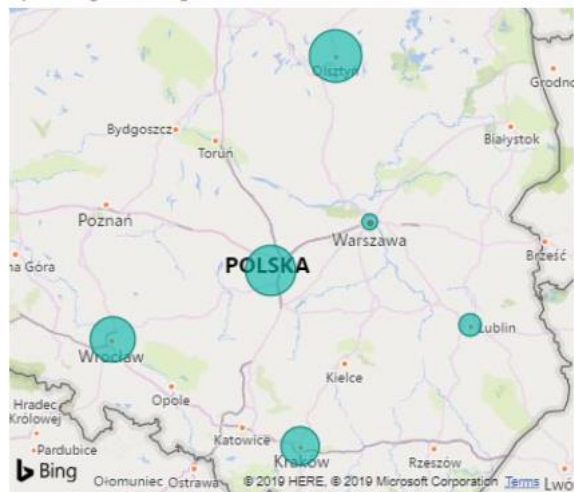


Jakie firmy aktualnie opracowują PB:

łącna długość [km] wg Wykonawca - Lider

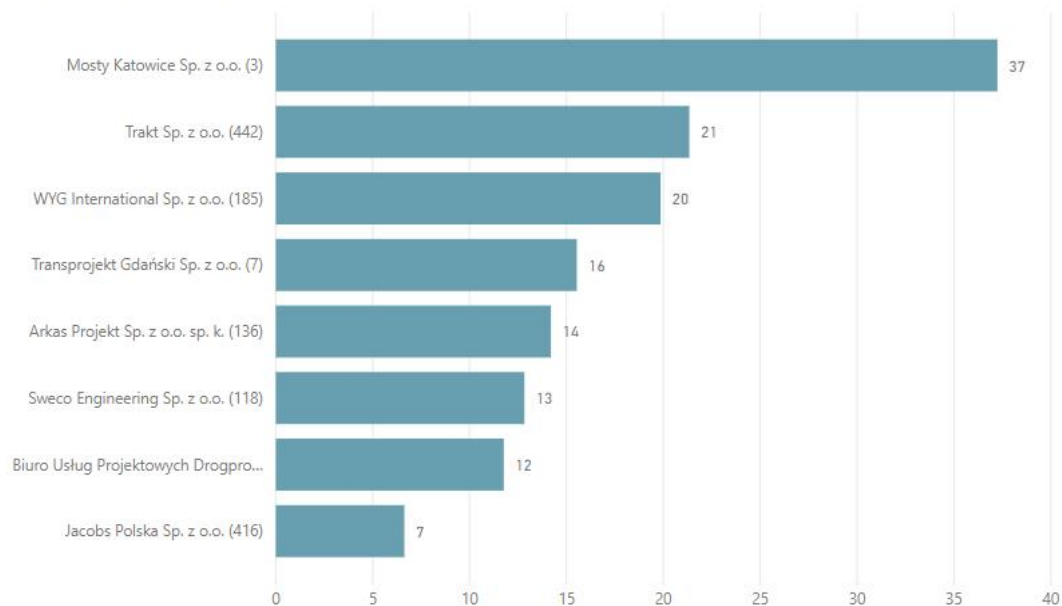

łącna długość [km] wg Oddział

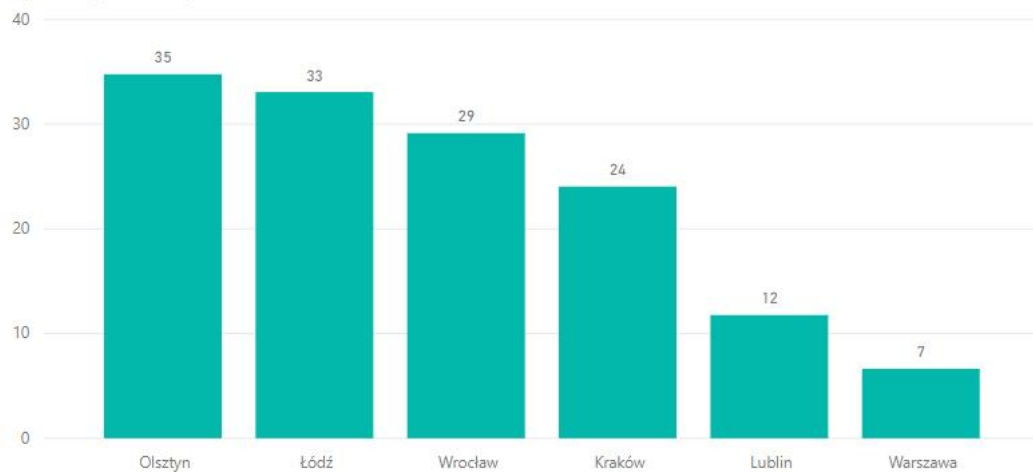

Łączna długość dróg będących na etapie przygotowania "tuż przed przetargiem na realizację"

Suma:


1 953

Łączna długość [km]

- Etap realizacji
- Przygotowanie – opracowano KP
 - Przygotowanie – opracowano PB
 - Przygotowanie – w opracowaniu KP
 - Przygotowanie – w opracowaniu PB
 - Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R


- StatusPBDK
- PBDK 1-117 (w limicie)
 - PBDK 118-158 (poza limitem)
 - Poza PBDK

Łączna długość [km] wg StatusPBDK

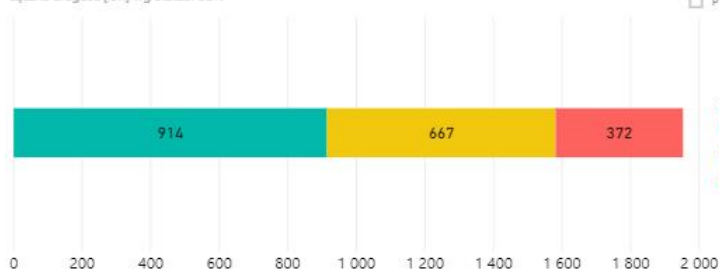


Łączna długość [km] wg Etap realizacji i StatusPBDK

StatusPBDK ● PBDK 1-117 (w limicie) ● PBDK 118-158 (poza limitem) ● Poza PBDK

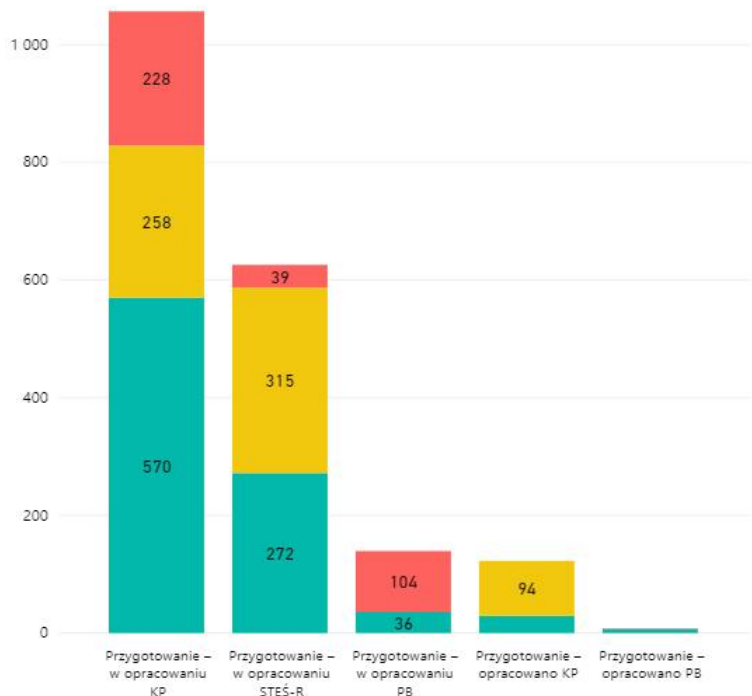


Łączna długość [km] wg Oddziału i StatusPBDK

StatusPBDK ● PBDK 1-117 (w limicie) ● PBDK 118-158 (poza limitem) ● Poza PBDK

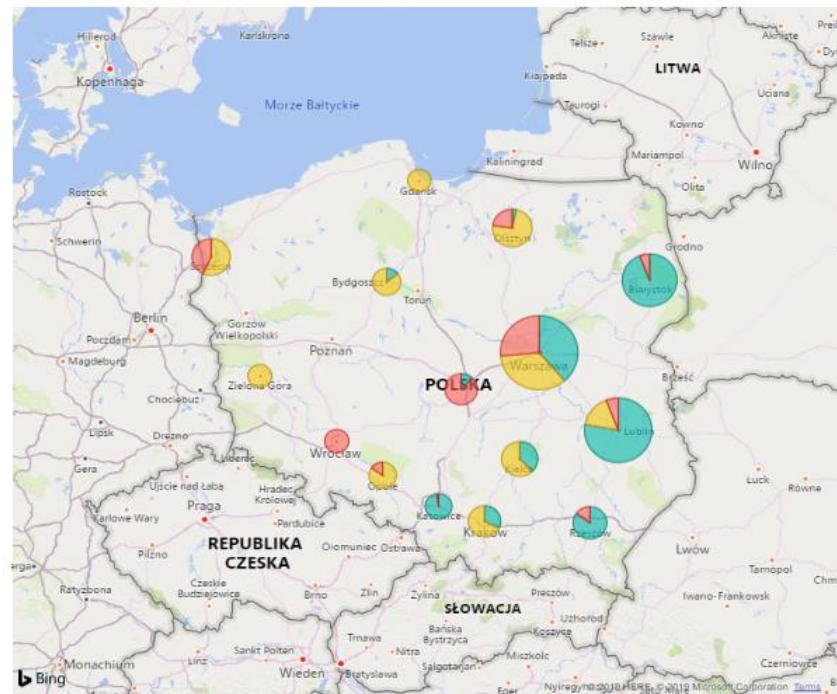

Łączna długość [km] wg Oddziału i StatusPBDK

StatusPBDK ● PBDK 1-117 (w limicie) ● PBDK 118-158 (poza limitem) ● Poza PBDK

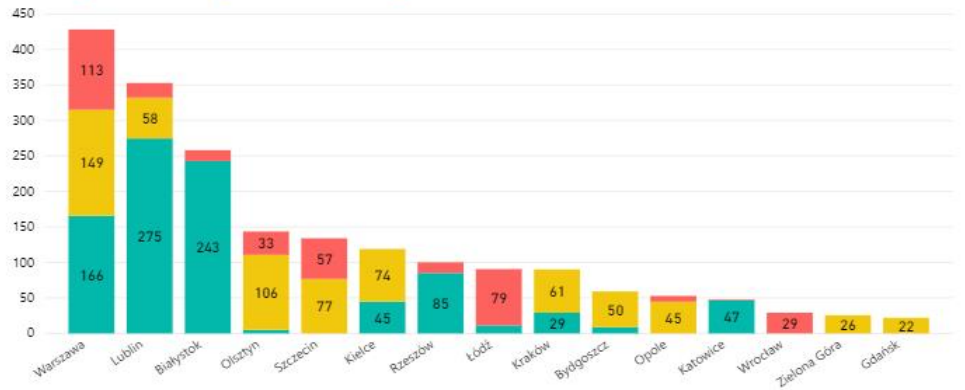

Ile odcinków mamy przed 1 kamieniem milowym



DLA TYCH ODCINKÓW NIE ZŁOŻONO JESZCZE WNIOSKU O ZRID

ETAP: Realizacja, nie ma ZRIDu i nie złożono wniosku, System: P&B

Nazwa	łączna długość [km]	Oddział
1. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczkí Zad.1 od m. Szczuczyn do w. Elk Południe (z węzłem)	23,26	Olsztyn
1. S3 odcinek realizacyjny 1: Zadanie III - w. Bolków (bez węzła) - w. Kamienna Góra Północ (bez węzła)	16,06	Wrocław
1. węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła)	19,46	Białystok
2. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczkí Zad.2 od w. Elk Południe (bez węzła) do w. Wysokie (bez węzła)	22,94	Olsztyn
2. S3 odcinek realizacyjny 2: Zadanie IV - w. Kamienna Góra Północ (z węzłem) - granica państwa	15,32	Wrocław
3. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczkí Zad3 od w. Wysokie (z węzłem) do m. Raczkí	20,17	Olsztyn
3. węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) – węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła)	7,19	Białystok
3. Widoma - w. Nowa Huta (dawniej w. Igołomska)	18,28	Kraków
4. w. Lasy Janowskie (dawniej Łązek Ordynacki, bez węzła) - w. Zdziary (z węzłem)	9,48	Rzeszów
4. węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem) – węzeł "Kolno" (bez węzła)	12,92	Białystok
5. w. Zdziary (bez węzła) - w. Rudnik nad Sanem (bez węzła)	8,23	Rzeszów
6. w. Rudnik nad Sanem (z węzłem) - w. Nisko Południe (z węzłem)	6,46	Rzeszów
7. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Podgórze (bez węzła)	11,15	Rzeszów
8. w. Podgórze (z węzłem) - w. Kamień (bez węzła)	10,34	Rzeszów
9. w. Kamień (z węzłem) - w. Sokółów Małopolski Północ (z węzłem)	8,19	Rzeszów
Budowa DK Nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+200,00	16,14	Kraków
Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr nr 40 (2 etapy) - etap II	14,60	Opole
odc. II węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice	12,33	Kraków
Przebudowa skrzyżowania na włączeniu I odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do istniejącej dk 44	0,25	Kraków
Zadanie 1: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)	10,40	Gdańsk
Zadanie 2: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem)	10,26	Gdańsk

273,39

łączna długość [km] wg Oddział

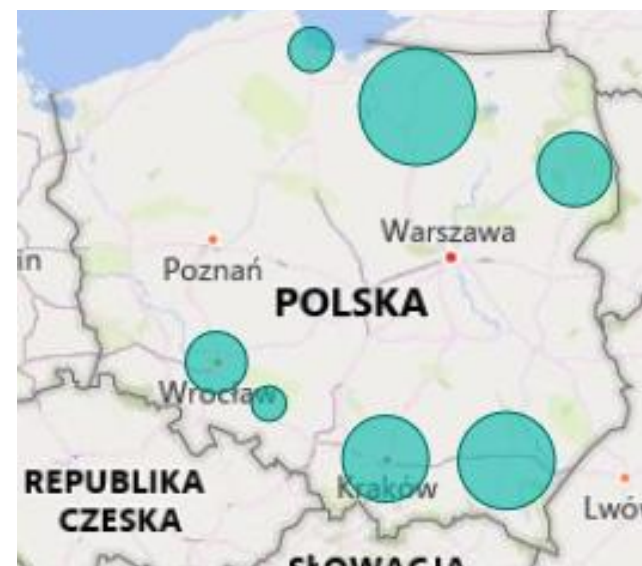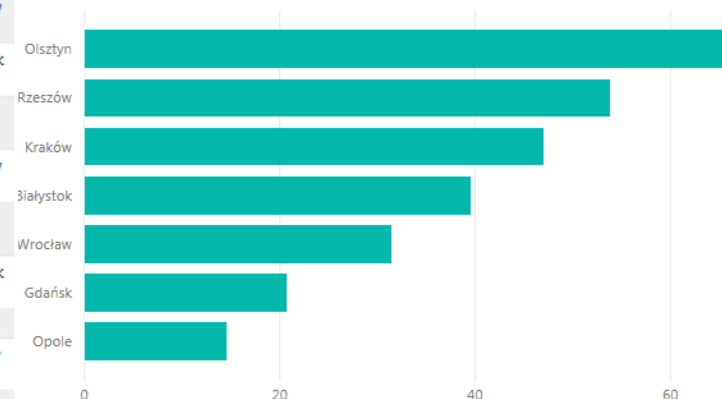


Ile odcinków mamy przed 1 kamieniem milowym
ZŁOŻONY WNIOSEK O ZRID , ale ZRID jeszcze nie uzyskany
ETAP: Realizacja, nie ma ZRIDu **ale złożono już wniosek**, System: P&B

Po wniosku, a przed ZRID

Nazwa	łączna długość [km]	Oddział
1. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) odc. Napierki - Mława	13,97	Olsztyn
1. Kraśnik (w. "Ślōdków" obecnie "Kraśnik Południe" bez węzła) - Janów Lubelski (w. Kopce obecnie Janów Lub. Północ" bez węzła) początek obwodnicy	18,15	Lublin
1. Lublin -w. "Niedrzwica Duża (W. Niedrzwica D.)	11,90	Lublin
1. Obwodnica Brzozowa wraz z odc. Brzozowo-Miękowo	22,38	Szczecin
1. Radziejowice-Przeszkoda	9,90	Warszawa
1. w.Lotnisko (bez węzła) - w. Lesznowola (z węzłem)	6,64	Warszawa
2. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Mława - Strzegowo	21,50	Olsztyn
2. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) – węzeł Rzęśnica (z węzłem)	3,85	Szczecin
2. obwodnica m. Janów Lubelski (w. Kopce obecnie "Janów Lub. Północ"- w. Jonaki obecnie Janów Lub. Południe" z węzłami)	6,45	Lublin
2. Przeszkoda-Paszków	11,62	Warszawa
2. Szczepanowice - Widoma	13,10	Kraków
2. w. "Niedrzwica Duża (w. Niedrzwica D.) - Kraśnik	20,48	Lublin
2. w. Lesznowola (bez węzła) - w. Tarczyn Północ (z węzłem)	14,80	Warszawa
2. węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła)	17,00	Białystok
3. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) odc. Strzegowo-Pieńki	21,99	Olsztyn
3. granica województwa - w. Skrudki	20,17	Lublin
3. Janów Lubelski (w. Jonaki obecnie "Janów Lub. Południe" bez węzła) - w. Łązek Ordynacki obecnie "Lasy Janowskie" (z węzłem)	8,28	Lublin
3. obwodnica m. Kraśnik (w. "Kraśnik" obecnie "Kraśnik Północ" - w. "Ślōdków" obecnie "Kraśnik Południe" z węzłami)	9,57	Lublin
4. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki-Płońsk	13,75	Olsztyn
5. węzeł "Kolno" (z węzłem) - węzeł "Stawiski" (bez węzła)	16,43	Białystok
6. węzeł "Stawiski" (bez węzła) - do obwodnicy Szczuczyna	18,00	Białystok
Budowa II jezdni obwodnicy Kobyłanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu drogi S10	6,40	Szczecin
Budowa IV i V odcinka obwodnicy Skawiny na odcinku od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe.	2,20	Kraków
Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	6,81	Opole
Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46	11,49	Opole
Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik - Przemyśl	14,97	Rzeszów
Budowa obwodnicy Warzymic i Przeclawia w ciągu dk 13	6,54	Szczecin
koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szpylisk	24,16	Białystok
Zadanie 3: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)	20,19	Gdańsk
	392,68	

Łączna długość [km] wg Oddział

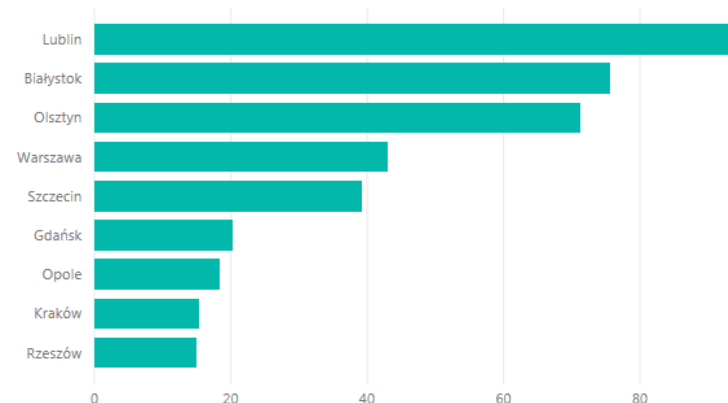

Planowane przetargi na roboty budowlane w 2019

Klasa i Nr drogi	Nazwa zadania według PBDK 2014-2023	Długość [km]	Oddział
	Zadania nowe		
S7	Budowa drogi S7 Gdańsk - Warszawa, odc. Płońsk - Czosnów	34,636 (3 odcinki)	Warszawa
S5	Budowa drogi S7 Elbląg - Olsztynek, odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51) S5 Ornowo-Wirwajdy	5,028	Olsztyn
S19	Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek, odc. w. Rzeszów Południe (bez węzła) - w. Babica (z węzłem)	10,250	Rzeszów
S7	Budowa drogi S7 gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków Moczydło (gr. Woj. Świętokrzyskiego) - Szczepanowice	odc 1 Moczydło-Miechów - 18,7 km odc 2 Miechów-Szczepanowice - 5,3 km	Kraków

Planowane przetargi na roboty budowlane w 2019


Klasa i Nr drogi	Nazwa zadania według PBDK 2014-2023	Długość [km]	Oddział
Postępowania powtarzane			
GP78	Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia Odcinek I: Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromotów)	16,57 km	Katowice /Opole
DK9	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK 9	2,70 km	Kielce

Planowane przetargi na roboty budowlane w 2019


Klasa i Nr drogi	Nazwa zadania według PBDK 2014-2023	Długość [km]	Oddział
Kontynuacje po odstąpieniach			
S3	S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Kaźmierzów - w. Lubin Północ	14,4 km (po Salini)	Wrocław
S7	S7 Warszawa - obwodnica Grójca, odc. w. Lotnisko - w. Lesznowola	(po Rubau)	Warszawa
S61	Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odc. w. Podborze – Śniadowo	(po Rubau)	Białystok
S5	S5 Nowe Marzy – Dworzysko, Dworzysko – Aleksandrowo, Białe Błota – Szubin, 3 odcinki	23,3 + 22,4 + 9,7 km (po Impresa Pizzarotti)	Bydgoszcz
S61	S61 Suwałki - Budzisko (gr. państwa)	24 km (po Impresa Pizzarotti)	Białystok
S5	„Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odcinek Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn”	15,88 km (po Toto)	Poznań



Biura projektowe zaangażowane w opracowanie STES, STES-R, KP, PB, dokumentacji projektowej na etapie realizacji

[km]

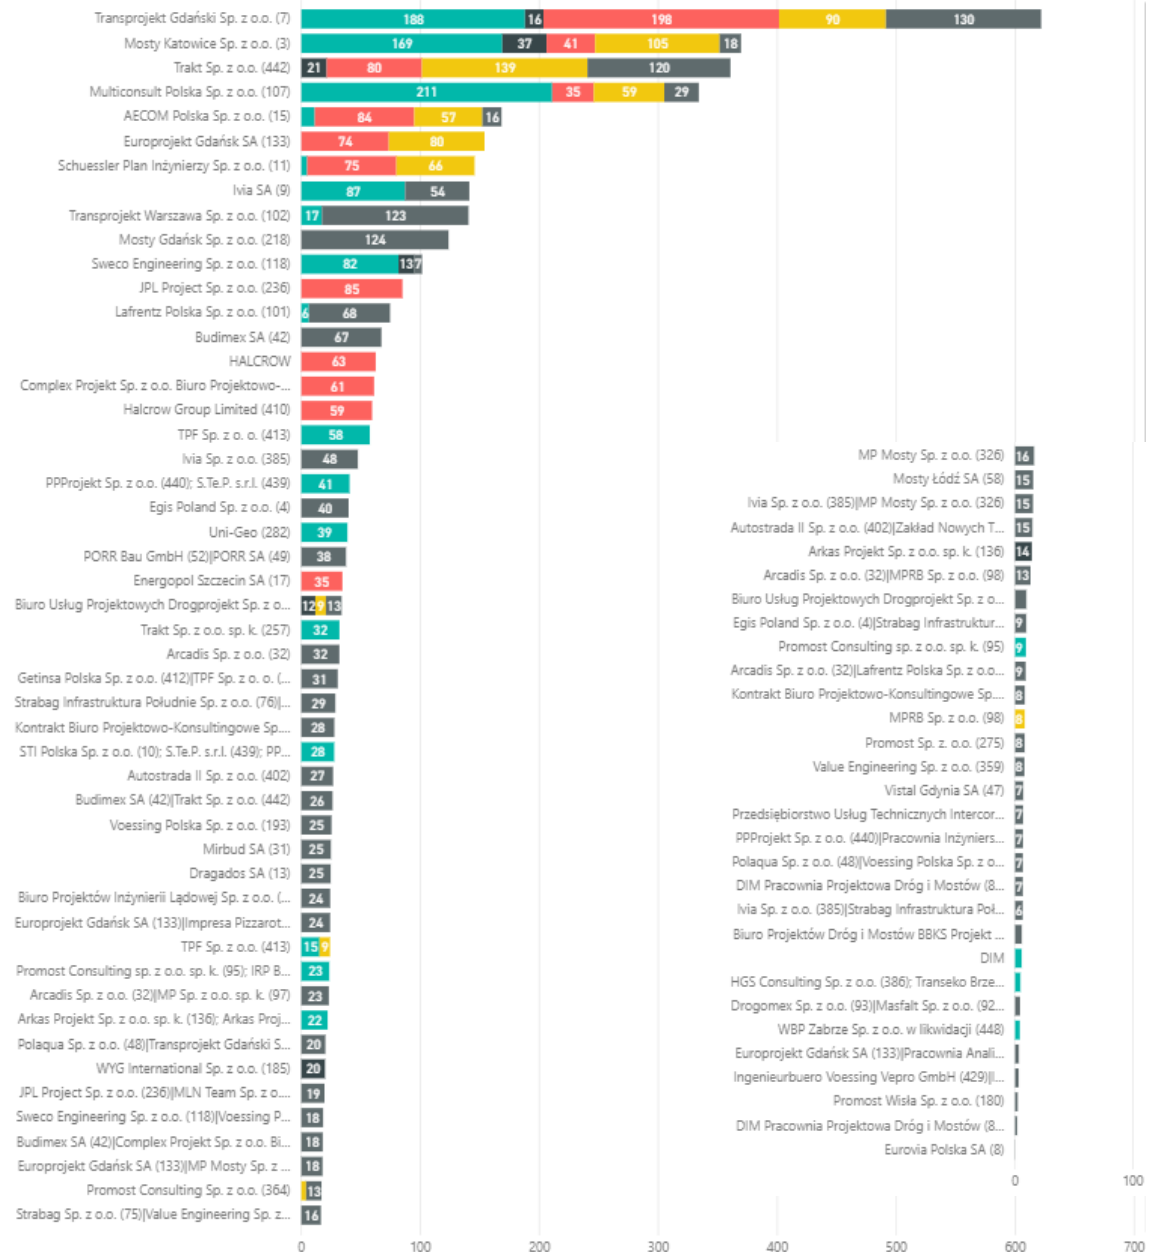


Firmy pełniące Nadzory [km]

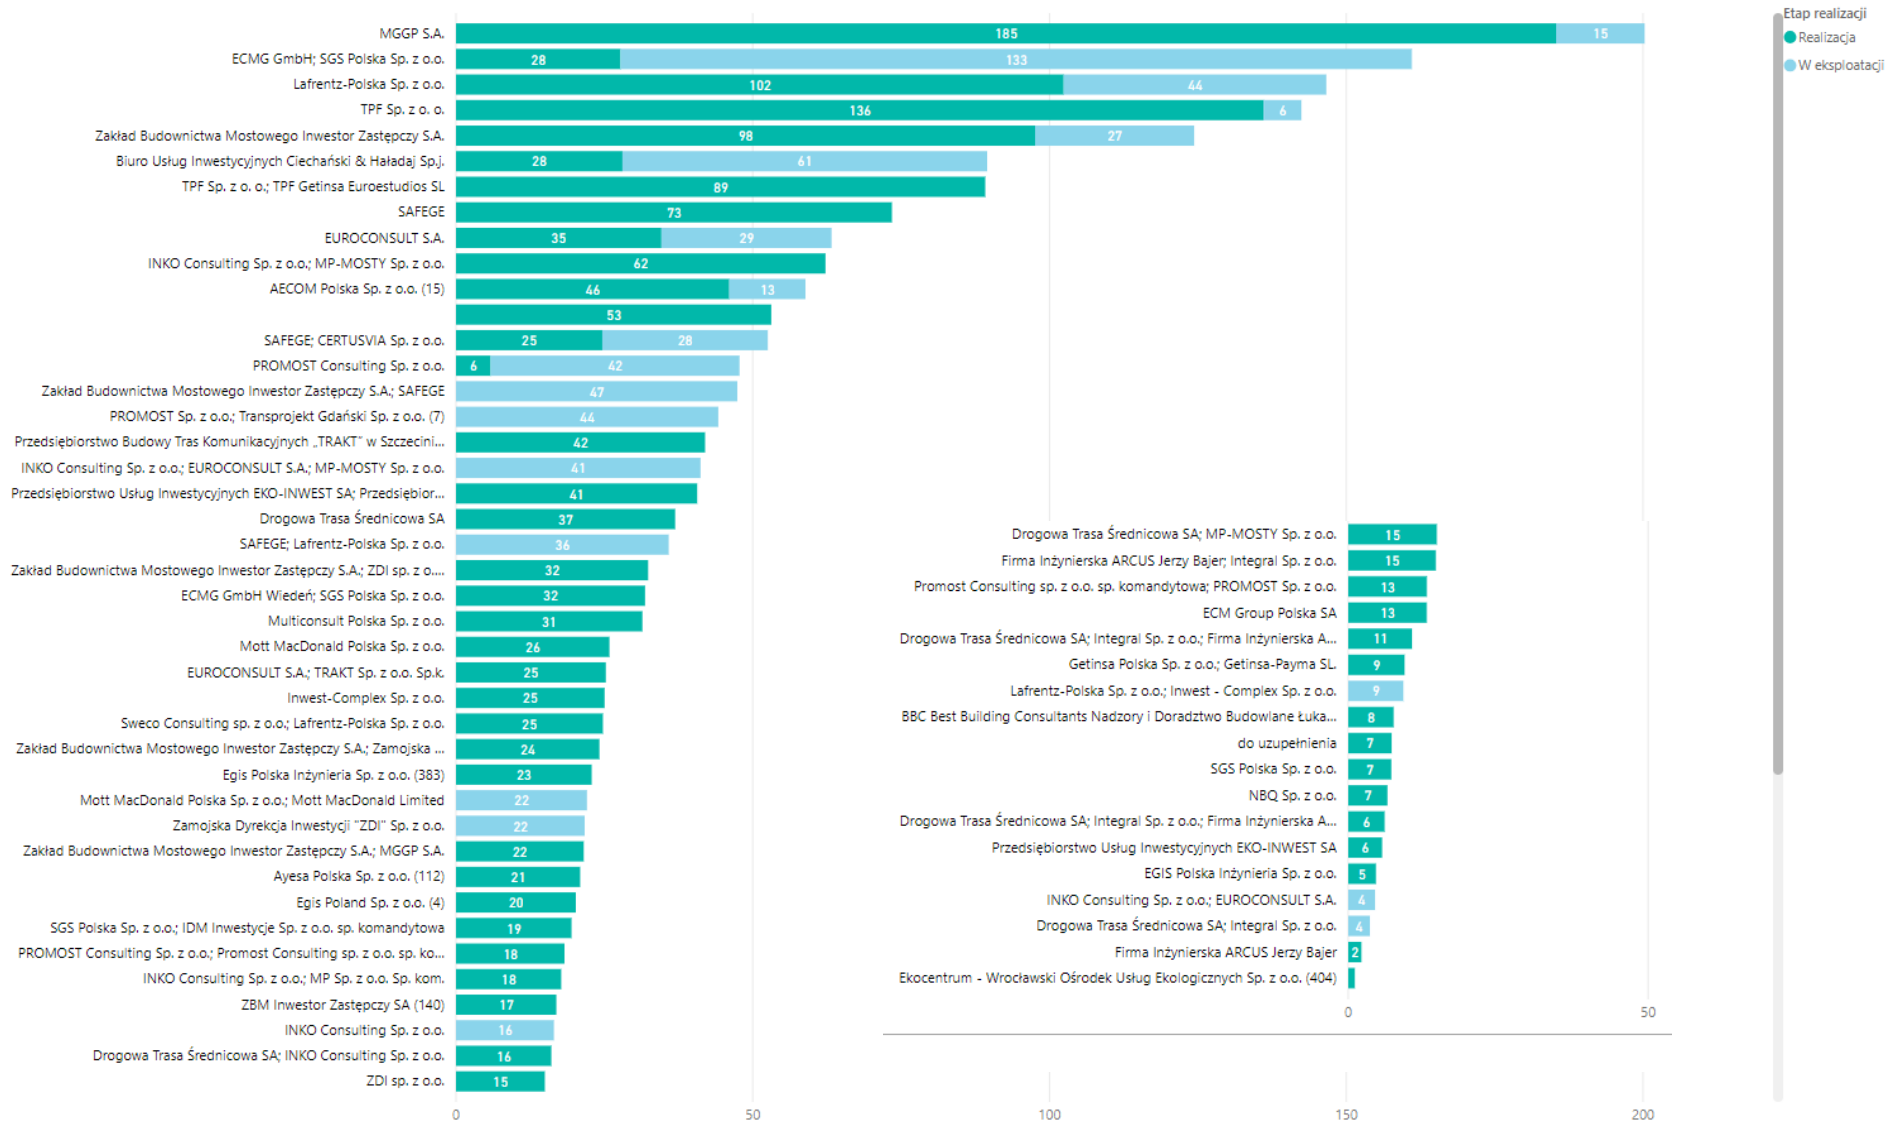

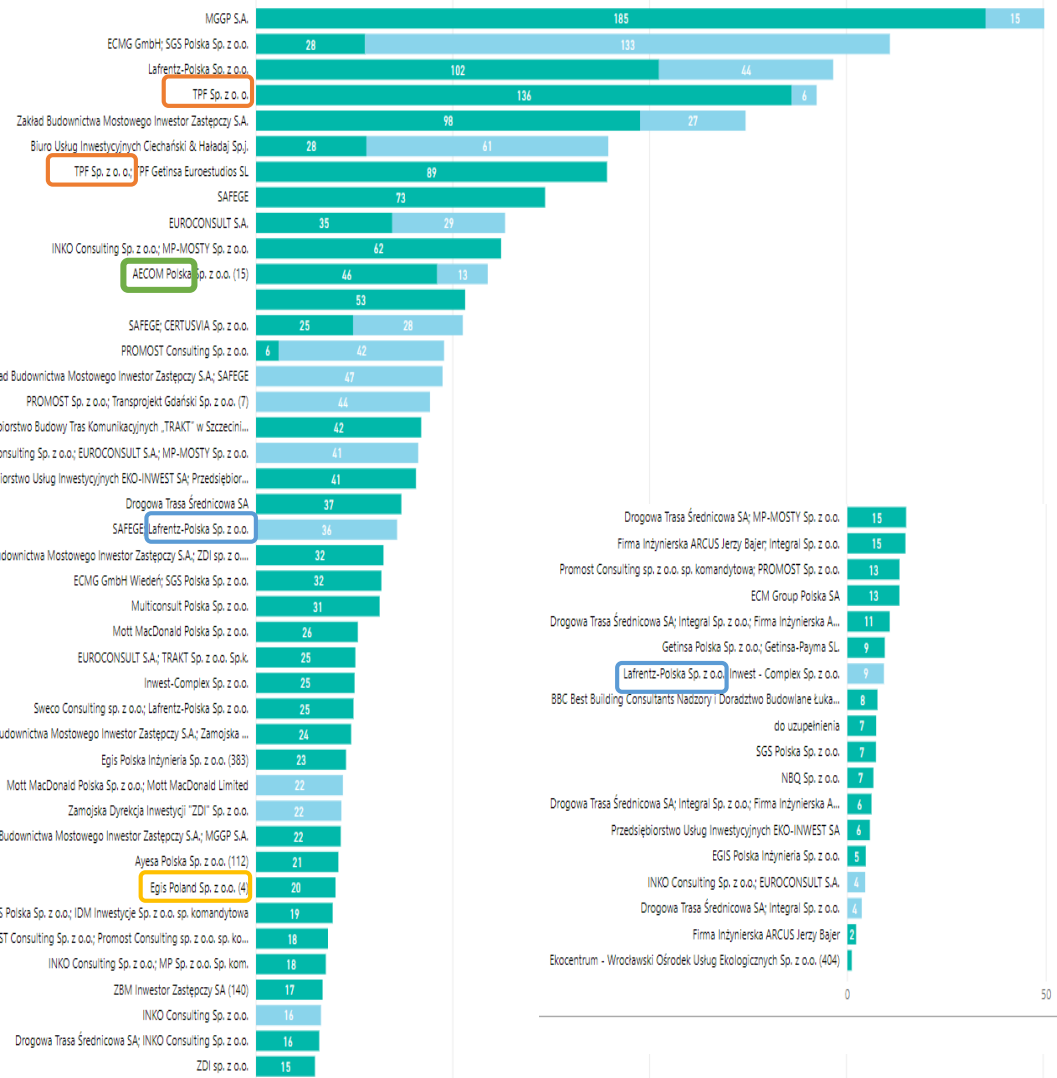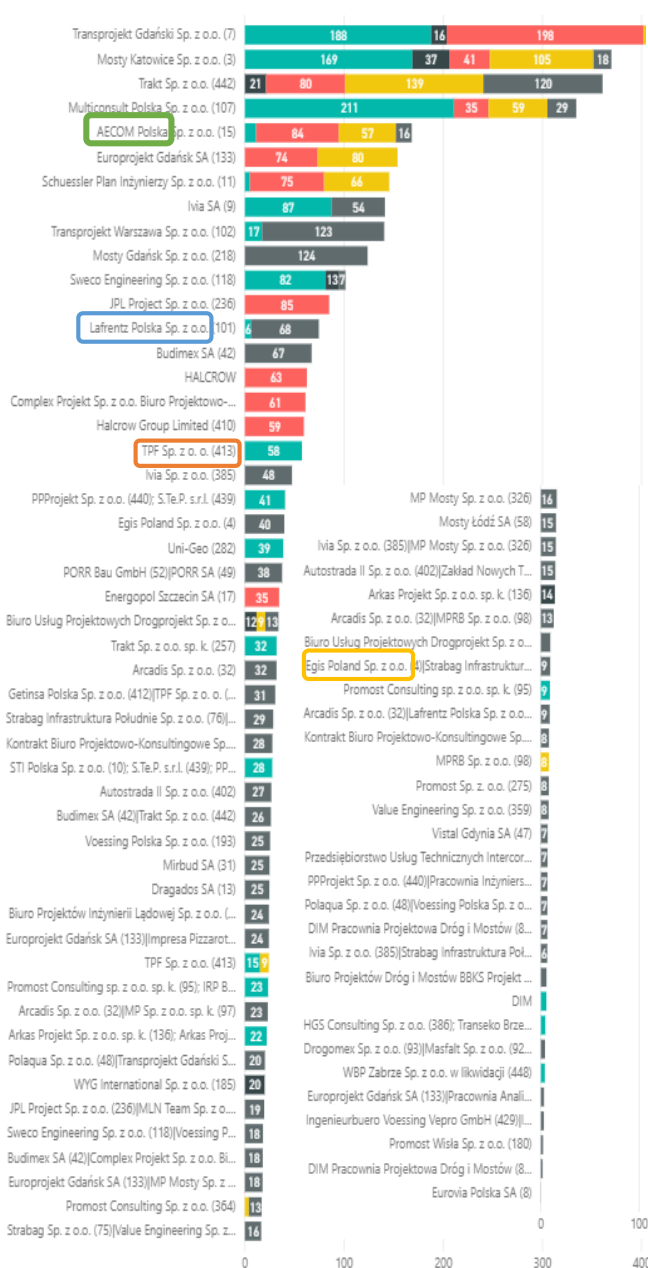


Decyzje środowiskowe - mediana długości procesów [m-c]

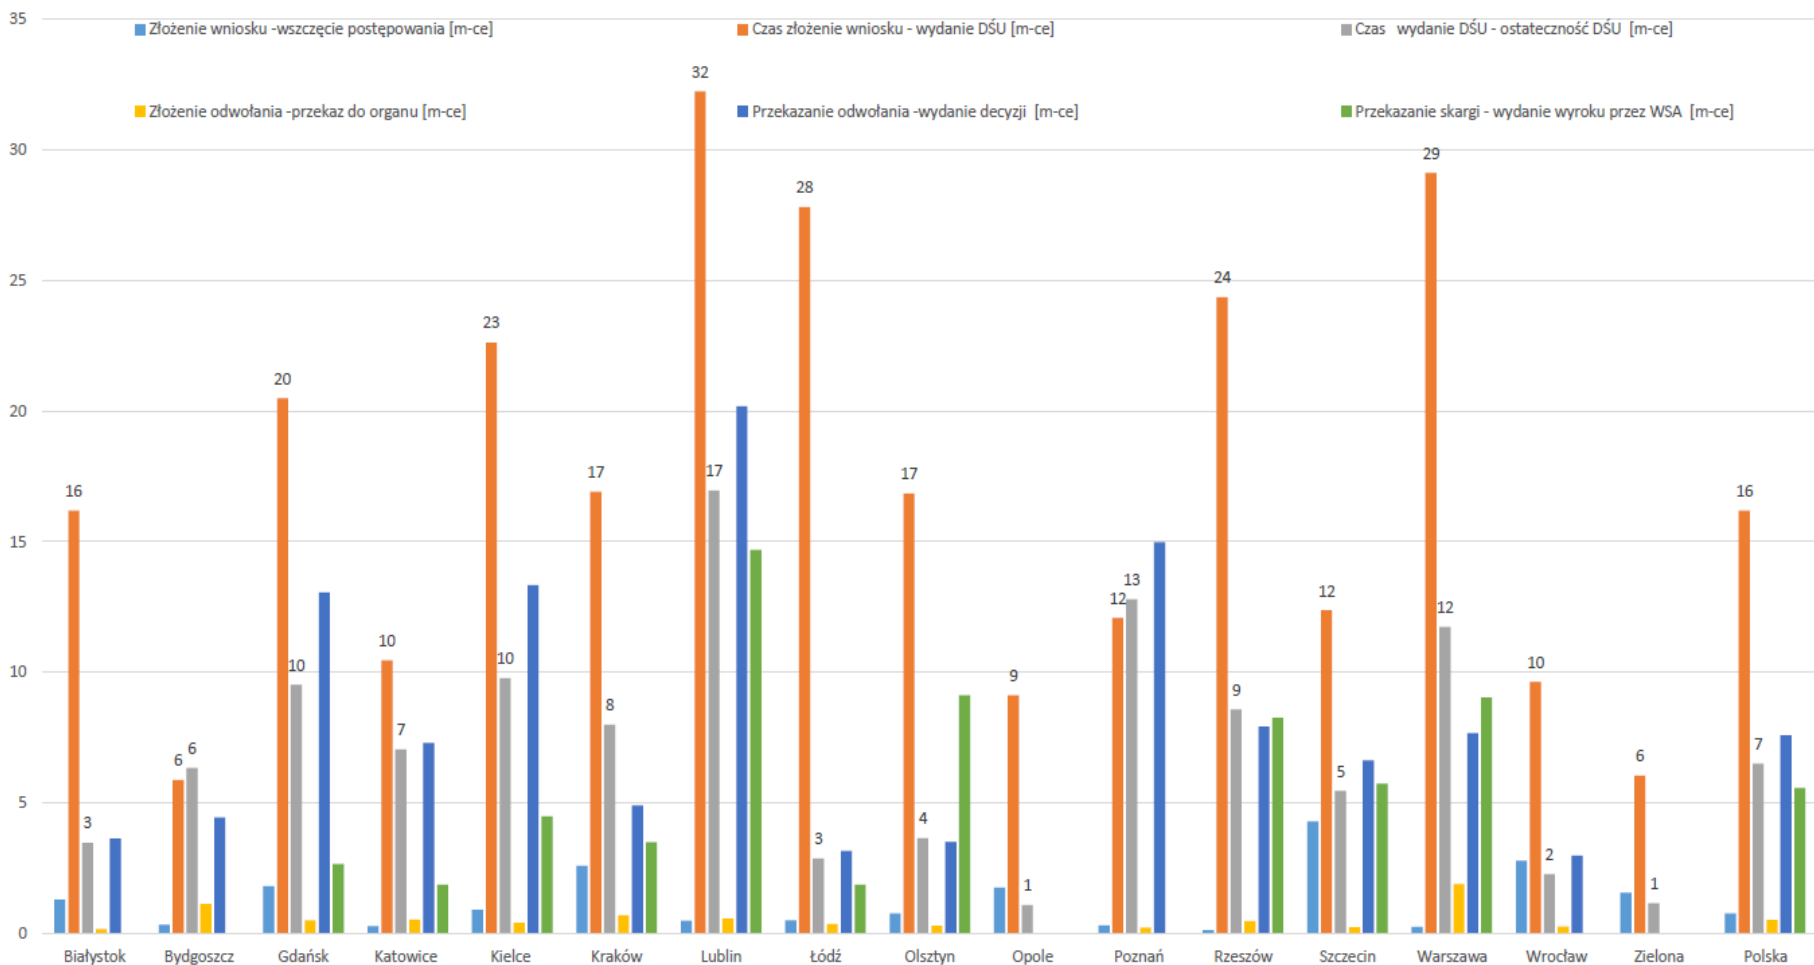


Czas trwania procedury uzyskania DŚU

Lp.	Początek okresu analiz	Koniec okresu analiz	Liczebność próby	Średni czas trwania postępowania [m-ce]	Okres min/max [m-ce]	Uwagi
1	Data złożenia wniosku o DŚU	Data wydania DŚU	139	13	13/39	Pominięto wartości powyżej 50 m-cy oraz nie uwzględniono inwestycji archiwalnych
2	Data wydania DŚU	Data ostateczności DŚU	130	5	1/46	

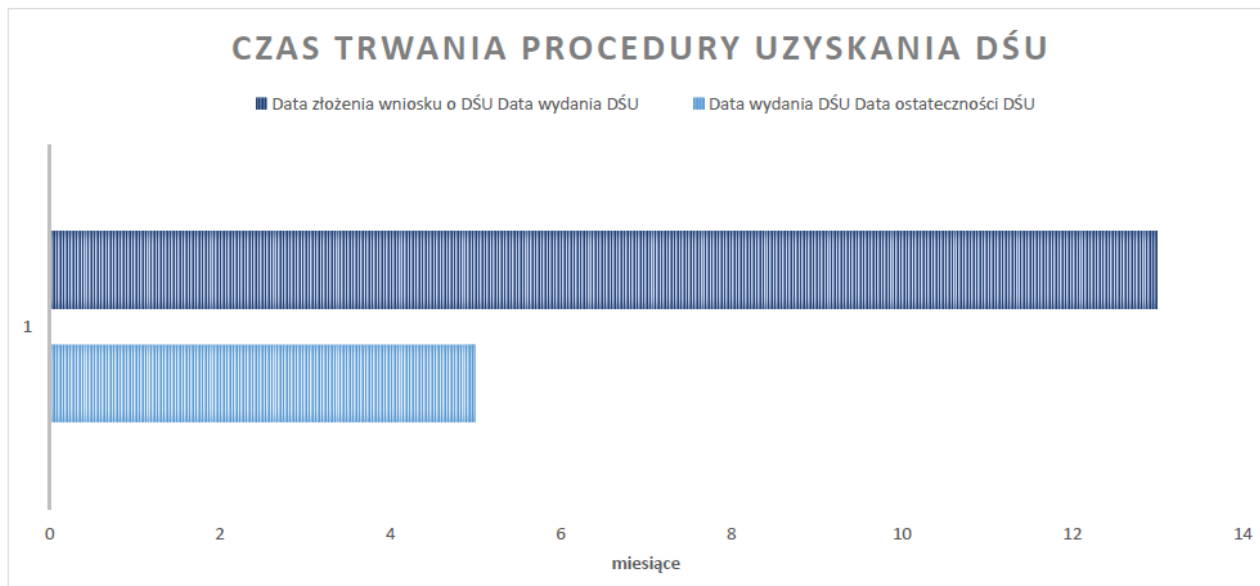


Czas [w miesiącach] od złożenia wniosku o ZRID do wszczęcia postępowania w podziale na Oddziały

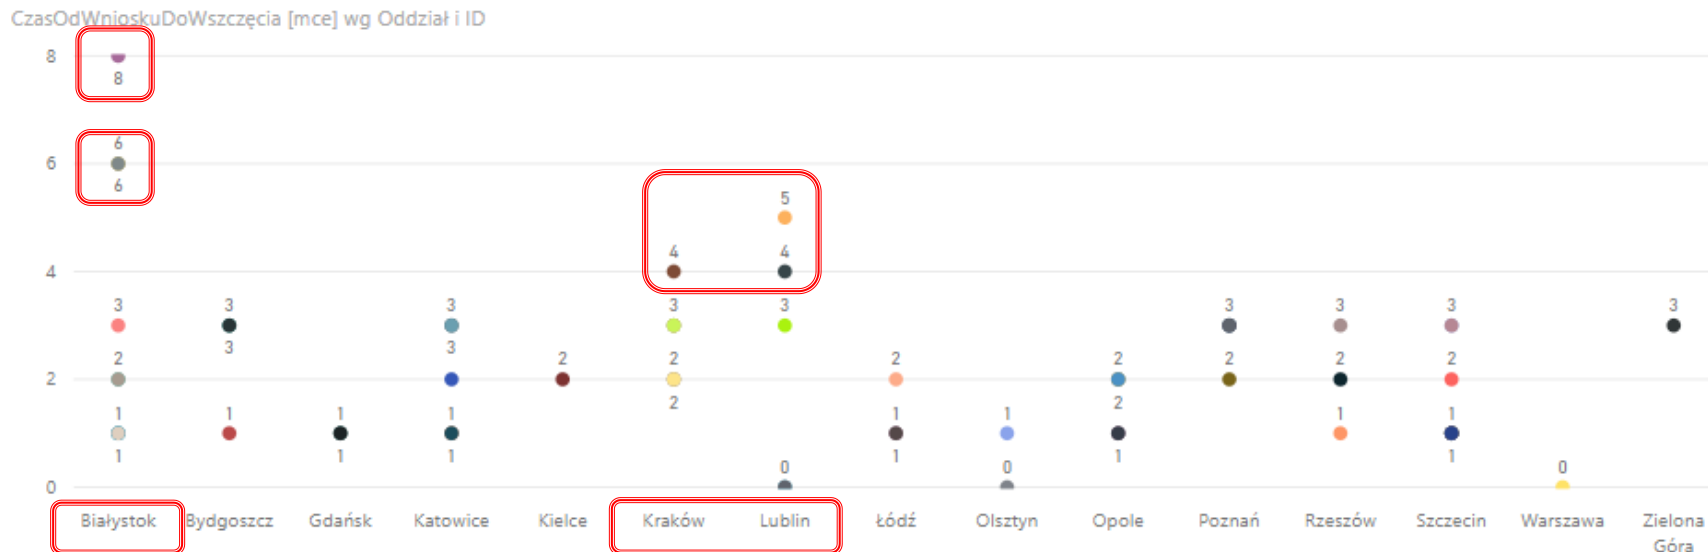

Mediana czasu [w dniach] od złożenia wniosku o ZRID do wszczęcia postępowania dla zadań GDDKiA to 2 miesiące czyli 61 dni.

Czas [w miesiącach] od złożenia wniosku o ZRID do wszczęcia postępowania w podziale na Wykonawcę dokumentacji na etapie realizacji

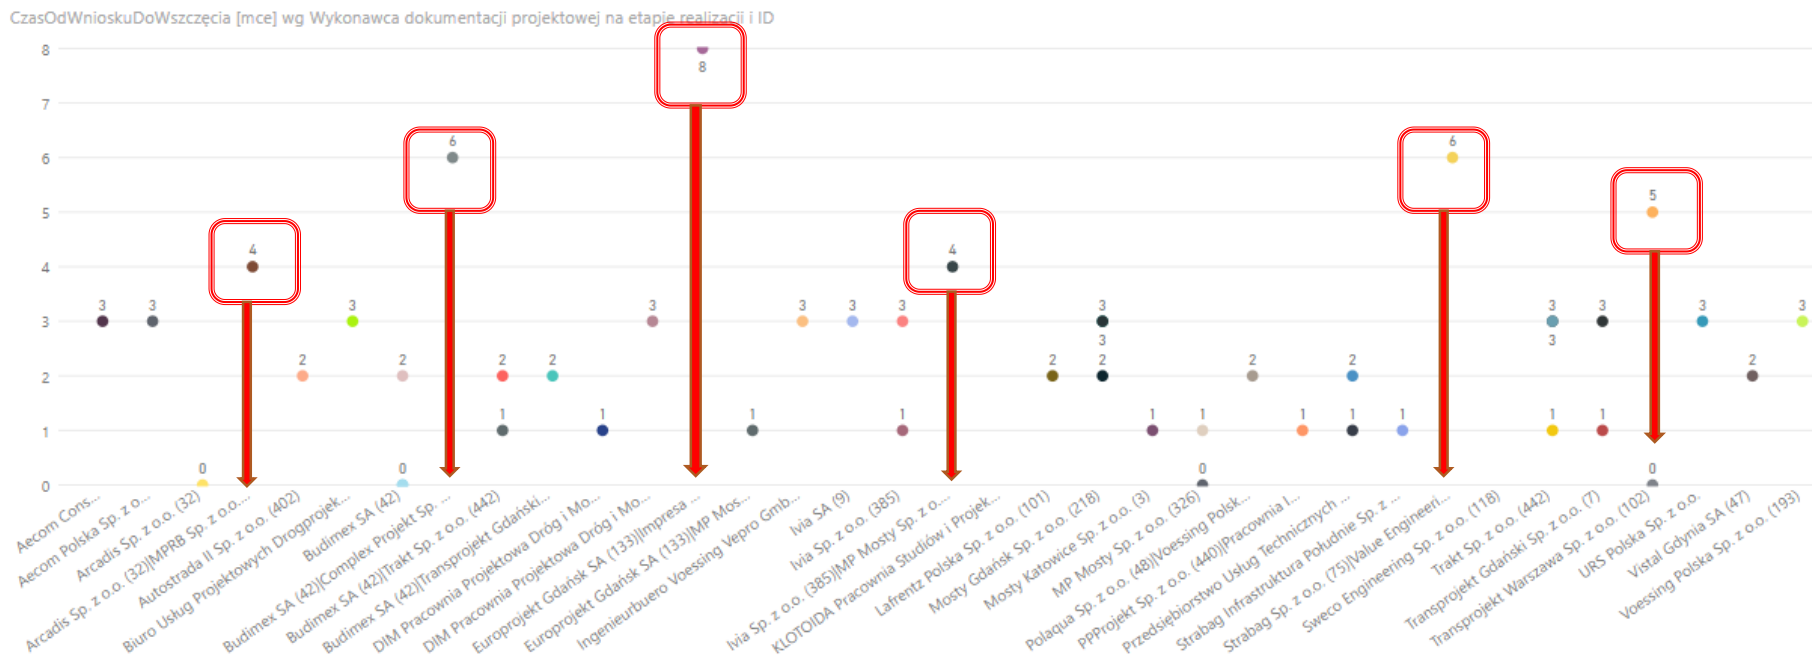


Miejsce 1 (8 m.) : S19 Suwałki – Budzisko

Miejsce 2 (6 m.) : S61 Kolno – Stawiski i S61 Stawiski – Szczuczyn

Miejsce 3 (5 m.) : S17 gr. woj. - w. Skrudki

Czas [w miesiącach] od złożenia wniosku o ZRID do wydania decyzji ZRID w podziale na Oddziały

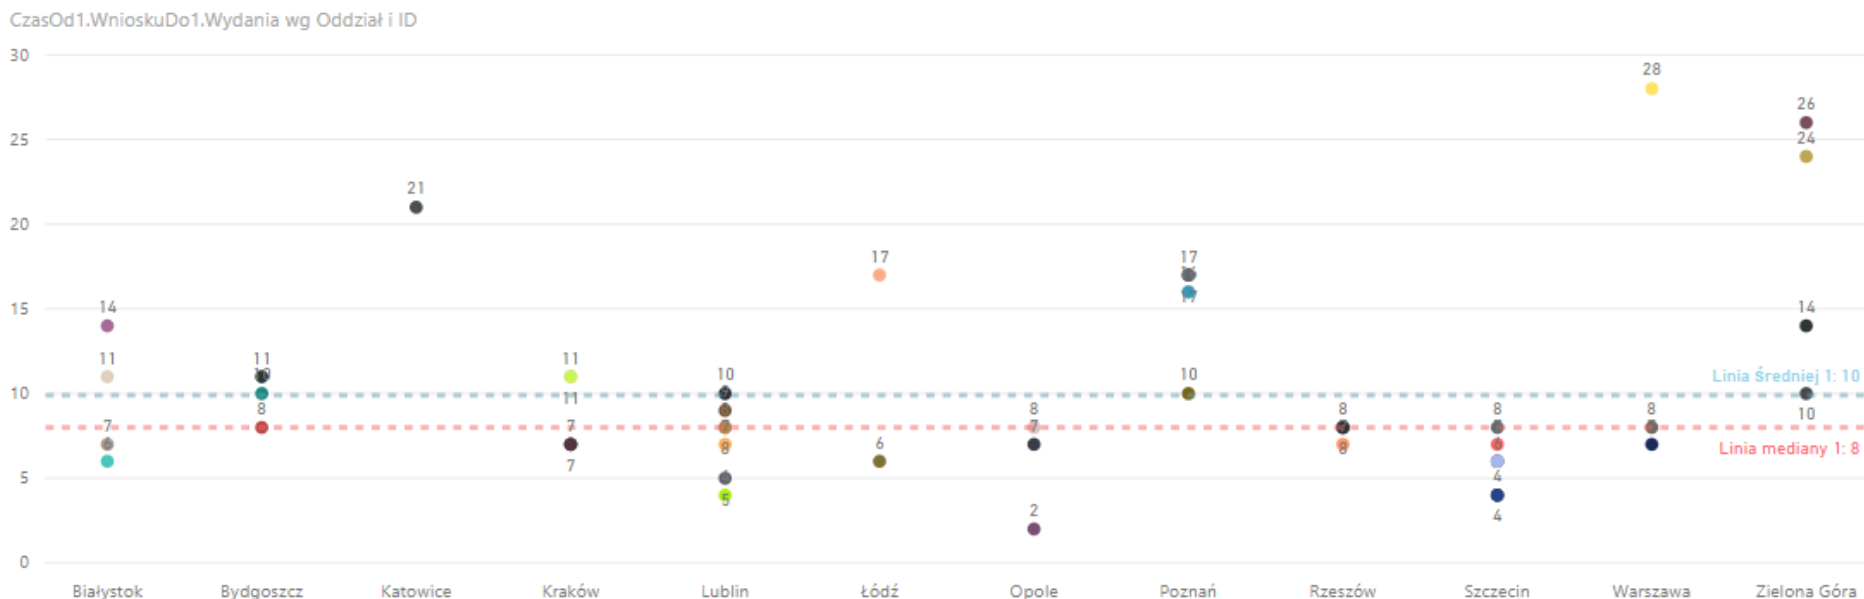

Mediana czasu [w dniach]

od złożenia wniosku o ZRID do wydania decyzji - dla zadań GDDKiA to 8 miesięcy tj. 244 dni
 od wszczęcia postępowania do wydania decyzji - dla zadań GDDKiA to 6 miesięcy tj. 186 dni

Czas [w miesiącach] od złożenia wniosku o ZRID do wydania decyzji ZRID w podziale na Wykonawcę dokumentacji projektowej na etapie realizacji

CzasOd1.WnioskuDo1.Wydania wg Wykonawca dokumentacji projektowej na etapie realizacji i ID



Tematy do dyskusji:

- Sposoby poprawić jakości procesu projektowania?

Dłuższe terminy ? BIM ? Większa szczegółowość wytycznych?

- Czy i jakie poza-cenowe kryteria w procedurze przetargowej dla dokumentacji ?
- Udział kosztów geologii i geotechniki w kosztach opracowań dokumentacji
- Wydajność i jakość prac podwykonawców: geologów, geodetów, kosztorysantów...

Tematy do dyskusji:

- Zaliczki : jeśli tak, to jakiej wysokości ?
- Waloryzacja – jaki koszyk ? Czy 50% CPI wystarczy ?
- Obowiązki podatkowe a termin wykonania dzieła.
- Płatności częściowe : od czego je uzależnić ?
- Kary Umowne. Jak egzekwować termin po osiągnięciu limitu kar?

Dedykowana Polisa?

Tematy do dyskusji:

- Relacje Projektant – Wykonawca - Zamawiający w systemie P&B, O&B i Buduj
- Projektowanie oczami Nadzoru Inwestorskiego - egzekucja wymagań SIWZ w P&B
- Urzędy i Organy współpracujące przy projektowaniu (jednolitość wymagań)
- Zmiany przepisów (WT dla dróg i obiektów inżynierskich oraz ustawy o Inżynierach

Budownictwa i Architektach)

Tematy do dyskusji:

- Stała i czasowa organizacja ruchu. Jakość materiałów do oceny.
- Wymagania GDDKiA dla dokumentacji stadiów STEŚ/STES-R, KP, PB i PW –
zarządzenie 58/2015
- „pomoc Zamawiającego” w uzyskaniu opinii, uzgodnień, decyzji
- Rozwiązania a ekonomia - na etapie STEŚ/KP i PB (P&B).

Dziękuję za uwagę

Tomasz Stańczak
